

CONTRATO:



CONTRATANTE: GAS MIG - Companhia de Gás de Minas Gerais

RELATÓRIO DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE RAMAL

CLIENTE:

ENDEREÇO:

DATA ____/____/____

TRECHO: RAMAL PEAD ENTRE VÁLVULA DE CALÇADA E CMRP


ABERTURA DE VALA					COBERTURA E ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES					EXTENSÃO DO RAMAL	EXTENSÃO DA FITA (m)
EXTENSÃO (m)	LARGURA (m)	PROFUND. (m)	TIPO DE SOLO	REAPROV. MATERIAL?	EXTENSÃO (m)	LARGURA MÉDIA (m)	PROFUND. (m)	VOLUME	MATERIAL		

MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS

DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO	Ø (mm)	PROFUNDIDADE (m)

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS INTERFERÊNCIAS

ISOMÉTRICO DO RAMAL (representar também as interferências)

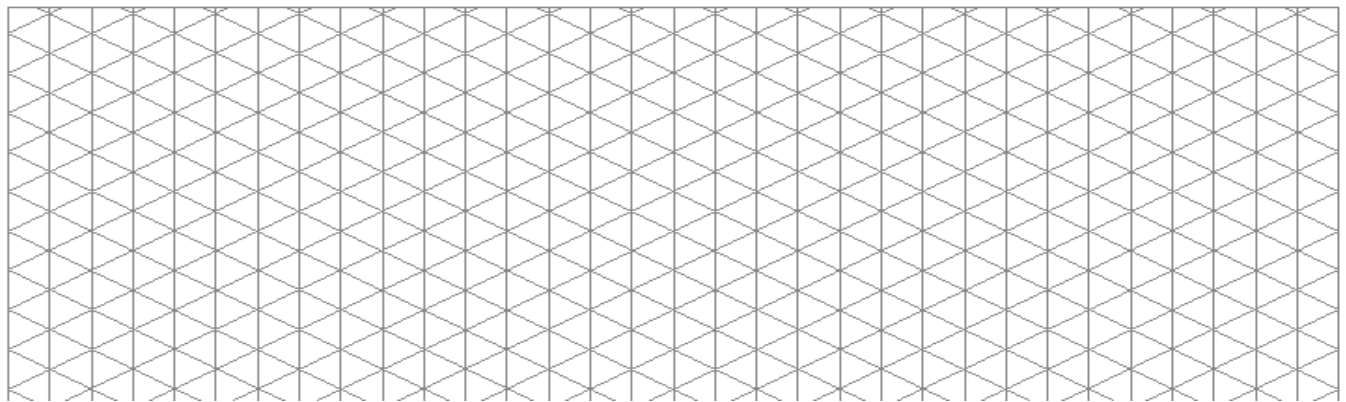

RELATÓRIO DE RECOMPOSIÇÃO

ITEM	TIPO DE PAVIMENTO	COMPR. x LARGURA	ITEM	TIPO DE PAVIMENTO	COMPR. x LARGURA
1	CONCRETO		5	GRAMA	
2	PEDRA PORTUGUESA		6	PEDRA MIRACEMA	
3	LADRILHO HIDRÁULICO		7	PASSEIO ESPECIAL	
4	PISO PODOTÁTIL		8	UTILIZAÇÃO DE TACHÕES: _____ (unid)	

OBSERVAÇÕES:

ENCARREGADO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FISCALIZAÇÃO

GASMIG Companhia de Gás de Minas Gerais

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SOLDA DE ELETROFUSÃO EM PEAD

CLIENTE:		DATA ____/____/____
ENDEREÇO:		

ITENS DE VERIFICAÇÃO

☐	RASPAGEM	☐	ALINHAMENTO	SOLDADOR:			
☐	LIMPEZA	☐	FIXAÇÃO			NÚMERO DO PG:	VALIDADE
☐	MARCAÇÃO	☐	LEITURA CÓD.BARRAS				

MÁQUINA DE SOLDA: (MARCA / MODELO / N° DE SÉRIE)

PEÇAS UTILIZADAS	MATERIAL	DIÂMETRO	FABRICANTE	LOTE:
	1 - TUBO PE 100 SDR 11	32 (mm)		
	2 - TUBO PE 100 SDR 11	63 (mm)		
	3 - CONEXÃO - LUVA DE UNIÃO	(mm)		
	4 - CONEXÃO - COTOVELO 90°	(mm)		
	5 - CONEXÃO - COTOVELO 45°	(mm)		
	6 - CONEXÃO - TRANSIÇÃO RETA 32 X 3/4"	(mm)		
	7 - CONEXÃO TIPO:	(mm)		
	8 - CONEXÃO TIPO:	(mm)		
	9 - CONEXÃO TIPO:	(mm)		

[illegible]

Comprimento total do ramal de PEAD: _____ (m)

Atenção: o alinhamento deverá ser mantido após o tempo de resfriamento. Não deverá haver derrame de material da solda.

OBSERVAÇÕES:

SOLDADOR DE PEAD	RESPONSÁVEL TÉCNICO	FISCALIZAÇÃO
