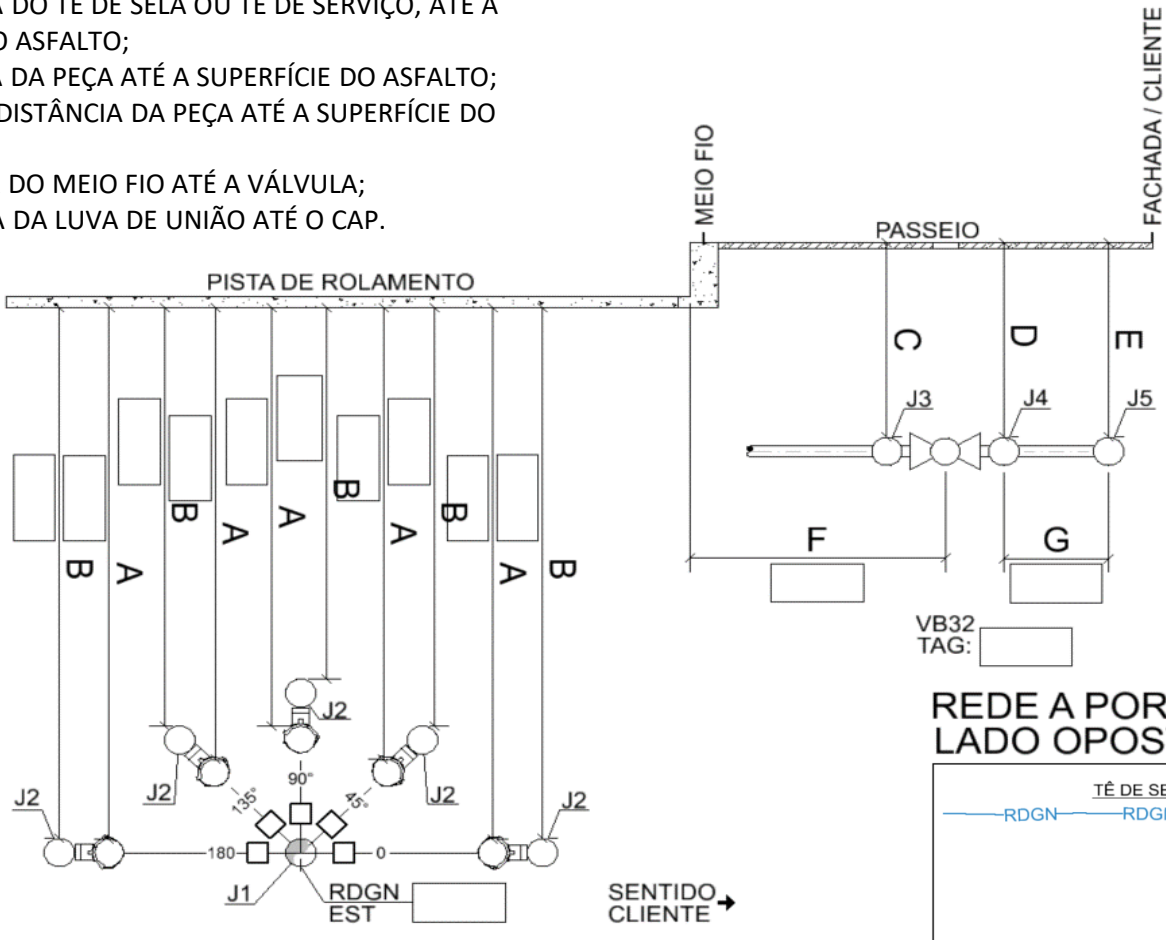
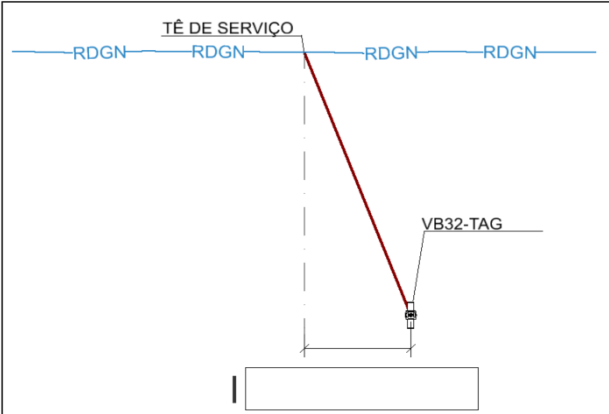



	CONTRATO Nº:	Logotipo da empresa		
	DIAGRAMA RAMAL EM CARGA (TRECHO B) - FURAÇÃO EM CARGA			
		FOLHA:	de	
CLIENTE:		DATA:		
ENDEREÇO DO CLIENTE:		ORDEM DE SERVIÇO (OS):		
ENDEREÇO DA VÁLVULA:		BAIRRO:	Nº	
"A" DISTÂNCIA DO TE DE SELA OU TE DE SERVIÇO, ATÉ A SUPERFÍCIE DO ASFALTO; "B" DISTÂNCIA DA PEÇA ATÉ A SUPERFÍCIE DO ASFALTO; "C", "D", "E" DISTÂNCIA DA PEÇA ATÉ A SUPERFÍCIE DO PASSEIO; "F" DISTÂNCIA DO MEIO FIO ATÉ A VÁLVULA; "G" DISTÂNCIA DA LUVA DE UNIÃO ATÉ O CAP.  REDE A PORTA ☐ LADO OPOSTO ☐   *Preencher a cota da divisa mais próxima *Preencher quando o ramal não estiver na perpendicular				
NOTAS GERAIS				
1) Dimensões em metro, exceto onde indicado		COTA DA FACHADA ATÉ A VÁLVULA		
2) Lista de material referente ao ramal citado		COTA DA RDGN ATÉ A VÁLVULA		
3) Antes de inciar as escavações efetuar sondagens para localização do gasoduto				
LISTA DE MATERIAIS				
Item	Descrição	Ø (mm)	Material	Quant. (m/und)
1	RAMAL EXISTENTE		PEAD PE 100 SDR 11	
2	TE DE SELA		Eletrofusão PE 100 SDR 11	
3	TE DE SERVIÇO		Eletrofusão PE 100 SDR 11	
4	LUVA DE UNIÃO		Eletrofusão PE 100 SDR 11	
5	VÁLVULA		Esfera PE 100 SDR 11	
6	CAP		Eletrofusão PE 100 SDR 11	
7	RAMAL (TUBO)		PEAD PE 100 SDR 11	
8	COTOVELO 45°		Eletrofusão PE 100 SDR 11	
9	COTOVELO 90°		Eletrofusão PE 100 SDR 11	
ELABORAÇÃO / APROVAÇÃO				
INSPETOR / SOLDADOR		RESPONSÁVEL TÉCNICO		FISCALIZAÇÃO
